

# Bureau Syndical SDE 07

**Vendredi 23 Janvier 2015**

**SDE 07 - PRIVAS**



# Point sur les travaux ER



**Bureau Syndical – Vendredi 23 Janvier 2015**

# AFFAIRES TRAVAUX ER

Programmes 2013 - 2014

Agriculteur

Equipement Communal

Extension

Renforcement / Fiabilisation


Dissimulation

Totalité des Affaires

# AGRICULTEUR

	2014	2015
Nbre Demande	52	2
Nbre APS	24	0
Montant APS TTC	942 256 €	- €
Nbre OS1	8	0
Montant APS Affaire	166 178 €	17 365 €
Nbre OS2	1	0
Montant travaux TTC	157 073 €	17 365 €
Delta APS/OS2	-5,8 %	0 %


Budget TTC	- €	- €
Engagé TTC	157 073 €	17 365 €
Payé TTC	21 332 €	- €
Nbre DGD à solder	0	0

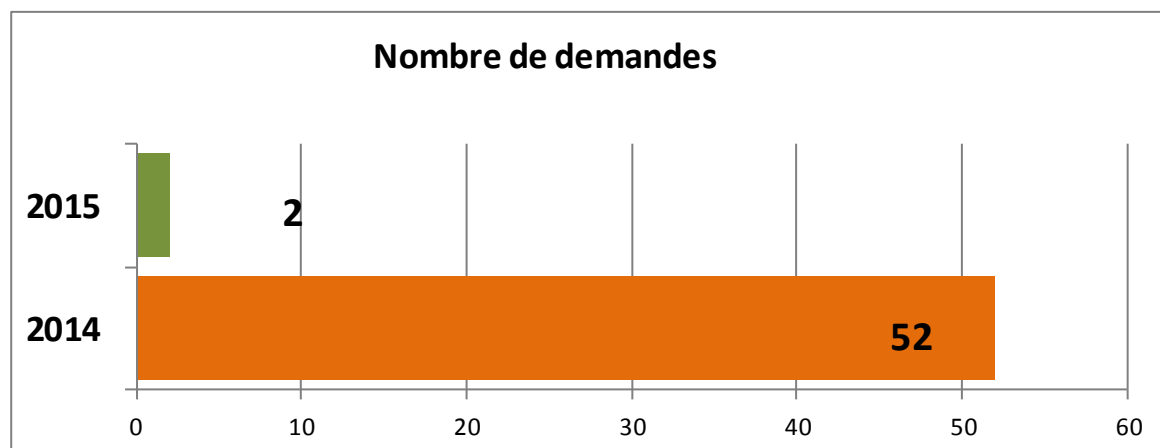

# EQUIPEMENT COMMUNAL

	2014	2015
Nbre Demande	41	6
Nbre APS	35	1
Montant APS TTC	1 405 685 €	10 139 €
Nbre OS1	21	3
Montant APS Affaire	1 015 346 €	304 084 €
Nbre OS2	8	0
Montant travaux TTC	828 565 €	304 084 €
Delta APS/OS2	-22,54 %	0 %


Budget TTC	- €	- €
Engagé TTC	828 565 €	304 084 €
Payé TTC	68 281 €	- €
Nbre DGD à solder	0	0

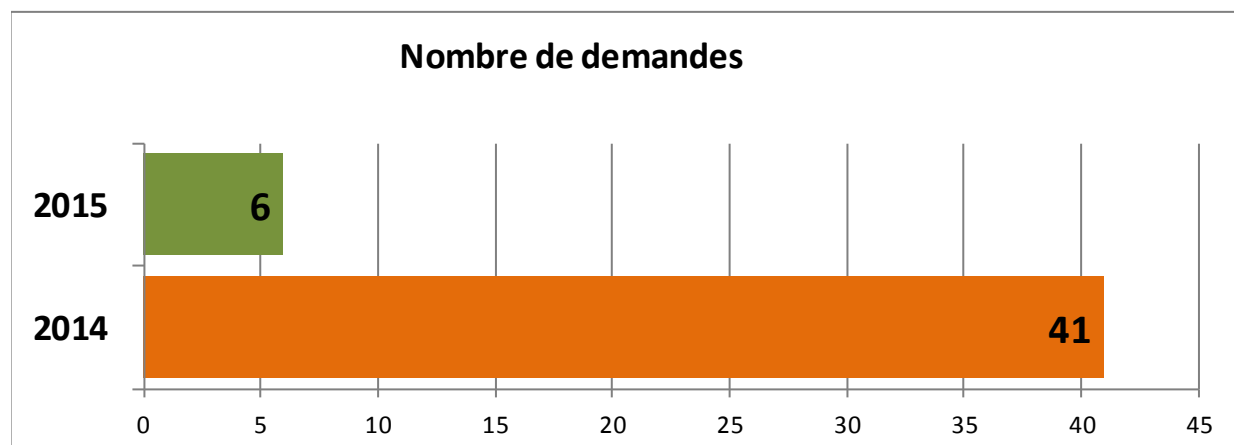

# EXTENSION

	2014	2015
Nbre Demande	1419	58
Nbre APS	453	13
Montant APS TTC	7 484 230 €	212 922 €
Nbre OS1	159	5
Montant APS Affaire	3 437 445 €	563 703 €
Nbre OS2	93	0
Montant travaux TTC	3 006 559 €	563 703 €
Delta APS/OS2	-14,33 %	0 %


Budget TTC	- €	- €
Engagé TTC	3 006 559 €	563 703 €
Payé TTC	693 939 €	- €
Nbre DGD à solder	8	0

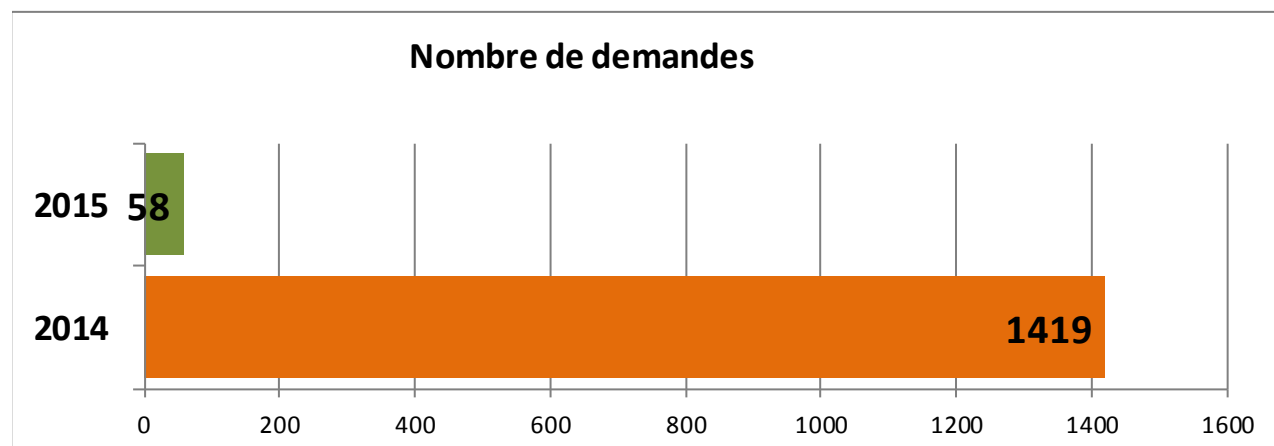

# RENFORCEMENT/FIABILISATION

	2014	2015
Nbre Demande	90	3
Nbre APS	71	1
Montant APS TTC	4 600 195 €	1 635 €
Nbre OS1	71	1
Montant APS Affaire	7 848 132 €	104 069 €
Nbre OS2	16	0
Montant travaux TTC	7 129 706 €	123 613 €
Delta APS/OS2	-10,08 %	15,81 %


Budget TTC	- €	- €
Engagé TTC	7 129 706 €	123 613 €
Payé TTC	79 067 €	- €
Nbre DGD à solder	2	0

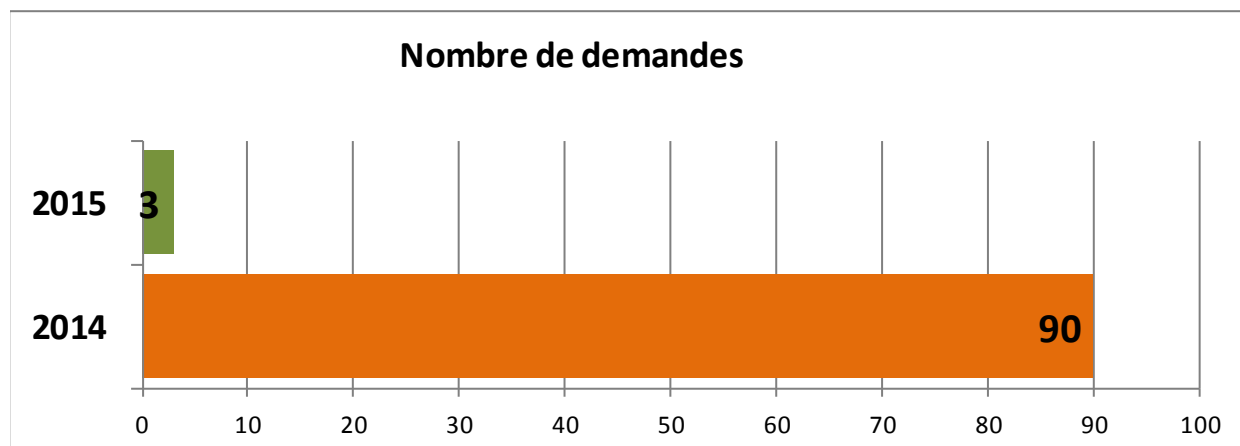

# DISSIMULATION

	2014	2015
Nbre Demande	64	6
Nbre APS	59	2
Montant APS TTC	7 030 917 €	135 212 €
Nbre OS1	35	8
Montant APS Affaire	4 086 855 €	1 924 933 €
Nbre OS2	11	0
Montant travaux TTC	3 847 807 €	1 924 933 €
Delta APS/OS2	-6,21 %	0 %

Budget TTC	- €	- €
Engagé TTC	3 847 807 €	1 924 933 €
Payé TTC	145 525 €	- €
Nbre DGD à solder	0	0

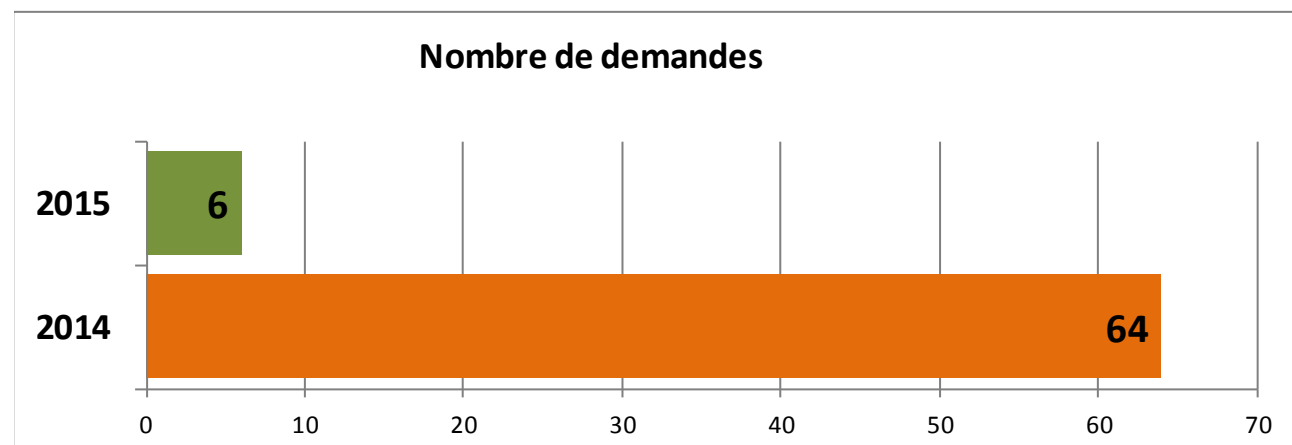




# TOTALITE DES AFFAIRES

	2014	2015
Nbre Demande	1666	75
Nbre APS	642	17
Montant APS TTC	21 463 282 €	359 908 €
Nbre OS1	294	17
Montant APS Affaire	16 553 956 €	2 914 153 €
Nbre OS2	129	0
Montant travaux TTC	14 969 710 €	2 933 698 €
Delta APS/OS2	-10,58 %	0,67 %

Budget TTC	- €	- €
Engagé TTC	14 969 710 €	2 933 698 €
Payé TTC	1 008 144 €	- €
Nbre DGD à solder	10	0

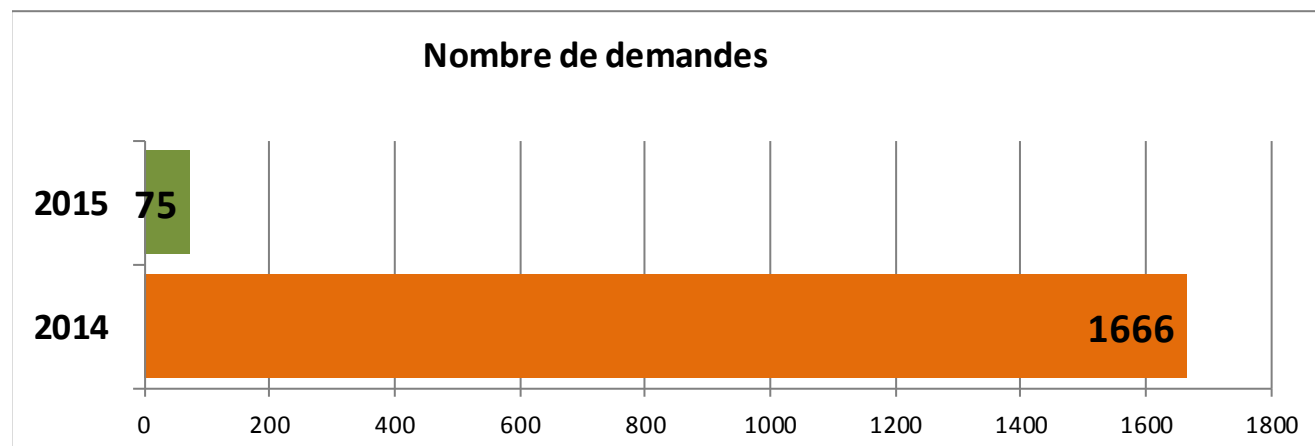



**Bureau Syndical – Vendredi 23 Janvier 2015**
